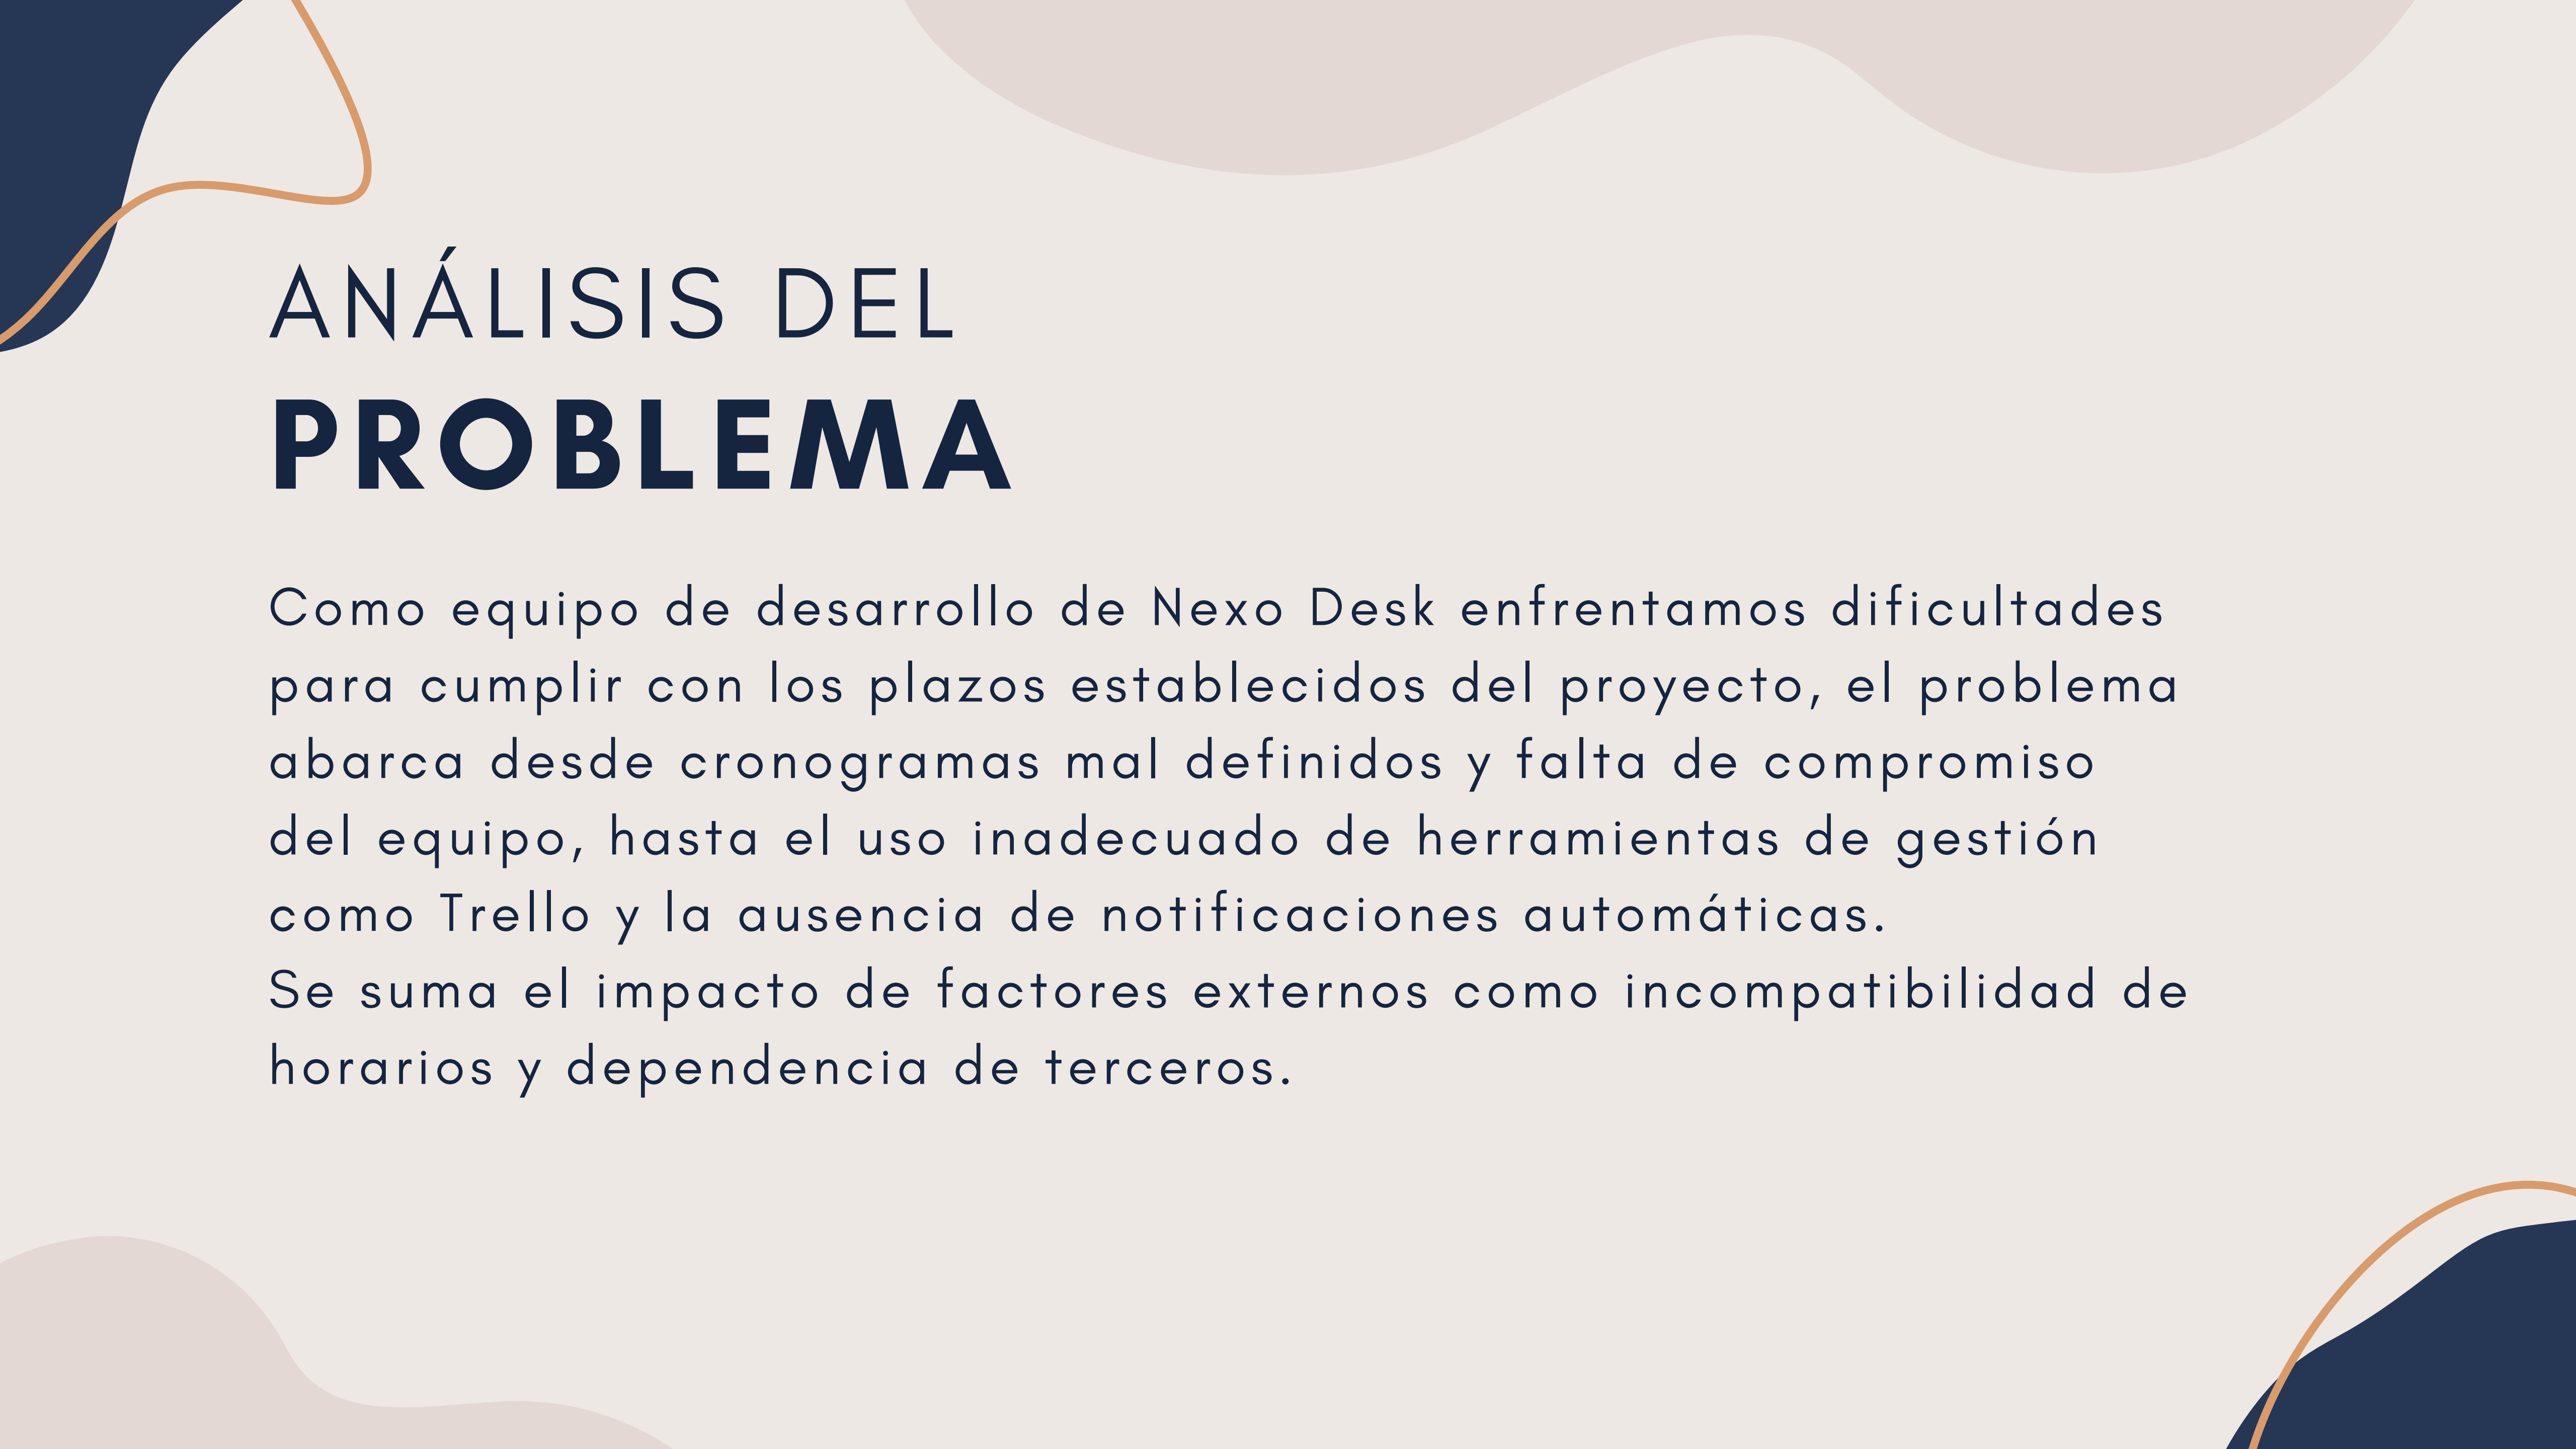






ANÁLISIS DEL **PROBLEMA**

Como equipo de desarrollo de Nexo Desk enfrentamos dificultades para cumplir con los plazos establecidos del proyecto, el problema abarca desde cronogramas mal definidos y falta de compromiso del equipo, hasta el uso inadecuado de herramientas de gestión como Trello y la ausencia de notificaciones automáticas. Se suma el impacto de factores externos como incompatibilidad de horarios y dependencia de terceros.

ANÁLISIS DEL PROBLEMA


NIVEL DE IMPACTO POR CATEGORIA


Gestión 

Personal 

Métodos 

Recursos 

Entorno 

Tecnología 

PLAN DE ACCIÓN

Acción	Categoría	Responsable	Plazo	Indicador de éxito
Redefinir el cronograma con hitos claros y prioridades semanales	Métodos	Líder del proyecto	Semana 1	Cronograma aprobado y visible al equipo
Establecer reuniones de seguimiento cada semana (standup 15 min)	Gestión	Líder del proyecto	Inmediato	Reuniones realizadas sin ausencias
Capacitar al equipo en el uso correcto de Trello (tableros, etiquetas, fechas)	Tecnología	Líder técnico	Semana 1-2	100% del equipo con tablero actualizado
Activar notificaciones automáticas en Trello para vencimientos	Tecnología	Líder técnico	Semana 1	Alertas activas en todas las tarjetas
Redistribuir tareas según disponibilidad real de cada integrante	Recursos	Líder del proyecto	Semana 1-2	Carga equilibrada documentada

PLAN DE ACCIÓN

Acción	Categoría	Responsable	Plazo	Indicador de éxito
Crear dashboard con indicadores de avance (% completado por sprint)	Gestión	Equipo completo	Semana 2	Dashboard visible y actualizado semanalmente
Definir acuerdos de disponibilidad horaria mínima semanal por integrante	Entorno	Todos los integrantes	Semana 1	Acuerdo firmado o registrado
Implementar política de actualización de estado de tareas (mínimo 2x/semana)	Personal	Cada integrante	Inmediato	Tasa de actualización ≥ 90%
Centralizar documentación del proyecto en una carpeta compartida estructurada	Recursos	Secretario del equipo	Semana 1-2	Documentos organizados y accesibles
Asignar un responsable de cada módulo con fecha de entrega individual	Métodos	Líder del proyecto	Semana 1	Cada módulo tiene dueño y fecha asignada

RESULTADOS ESPERADOS

Cumplimiento de plazos

Entrega de módulos según el cronograma redefinido, con una tasa de cumplimiento $\geq 85\%$.

Equipo alineado

Equipo alineado

Todos los integrantes conocen sus responsabilidades, fechas límite y estado del proyecto en tiempo real.

Trello como herramienta real

Tablero actualizado con notificaciones activas, reduciendo el desconocimiento de fechas a cero.

Equipo alineado

Dashboard activo que permite detectar retrasos en tiempo real y tomar decisiones oportunas.

Trello como herramienta real

Tablero actualizado con notificaciones activas, reduciendo el desconocimiento de fechas a cero.

Entrega final exitosa

Nexo Desk entregado completo, funcional y dentro del plazo acordado con el cliente o docente.

Carga de trabajo balanceada

Distribución equitativa de tareas que reduce la sobrecarga individual y mejora la calidad del código.
